


KMR + Hausanschlüsse		Wochen	Zeitspanne
		1,0	KW 17 Einrichten
1	BA Mitte Ost Nach Schule Dorfgraben - Kirchh	6,0	KW 18 bis KW 23
2	BA West Marburger Straße bis über die Kreisstr	4,0	KW 24 bis KW 27
3	BA Mitte Ost Am Breitenstein bis K27	6,0	KW 28 bis KW 33
4	BA Mitte Ost Zentrale - Schule - Dorfgraben	5,0	KW 34 bis KW 38
		1,0	KW 39 Zeitpuffer
			KW 40 Befüllen
PEX + Hausanschlüsse		Wochen	Zeitspanne
1	BA West Waldblick - HA MarburgerStr.28	3,0	KW 18 bis KW 20
2	BA West Kindergartenstraße	2,0	KW 21 bis KW 22
3	BA West Zu den Hobern - Am Gansacker	4,4	KW 23 bis KW 27
4	BA Mitte Ost Zur Ecke	2,0	KW 28 bis KW 29
5	BA Mitte Ost Am Hirtenrain	3,0	KW 30 bis KW 32
6	BA Mitte Ost Raiffeisenstraße	4,0	KW 33 bis KW 36
7	BA Mitte Ost Neue Gasse	1,6	KW 37 bis KW 38
8	BA Mitte Ost Kirchhainer Straße	3,0	KW 38 bis KW 40
9	BA West Dorfgraben West	0,8	KW 40

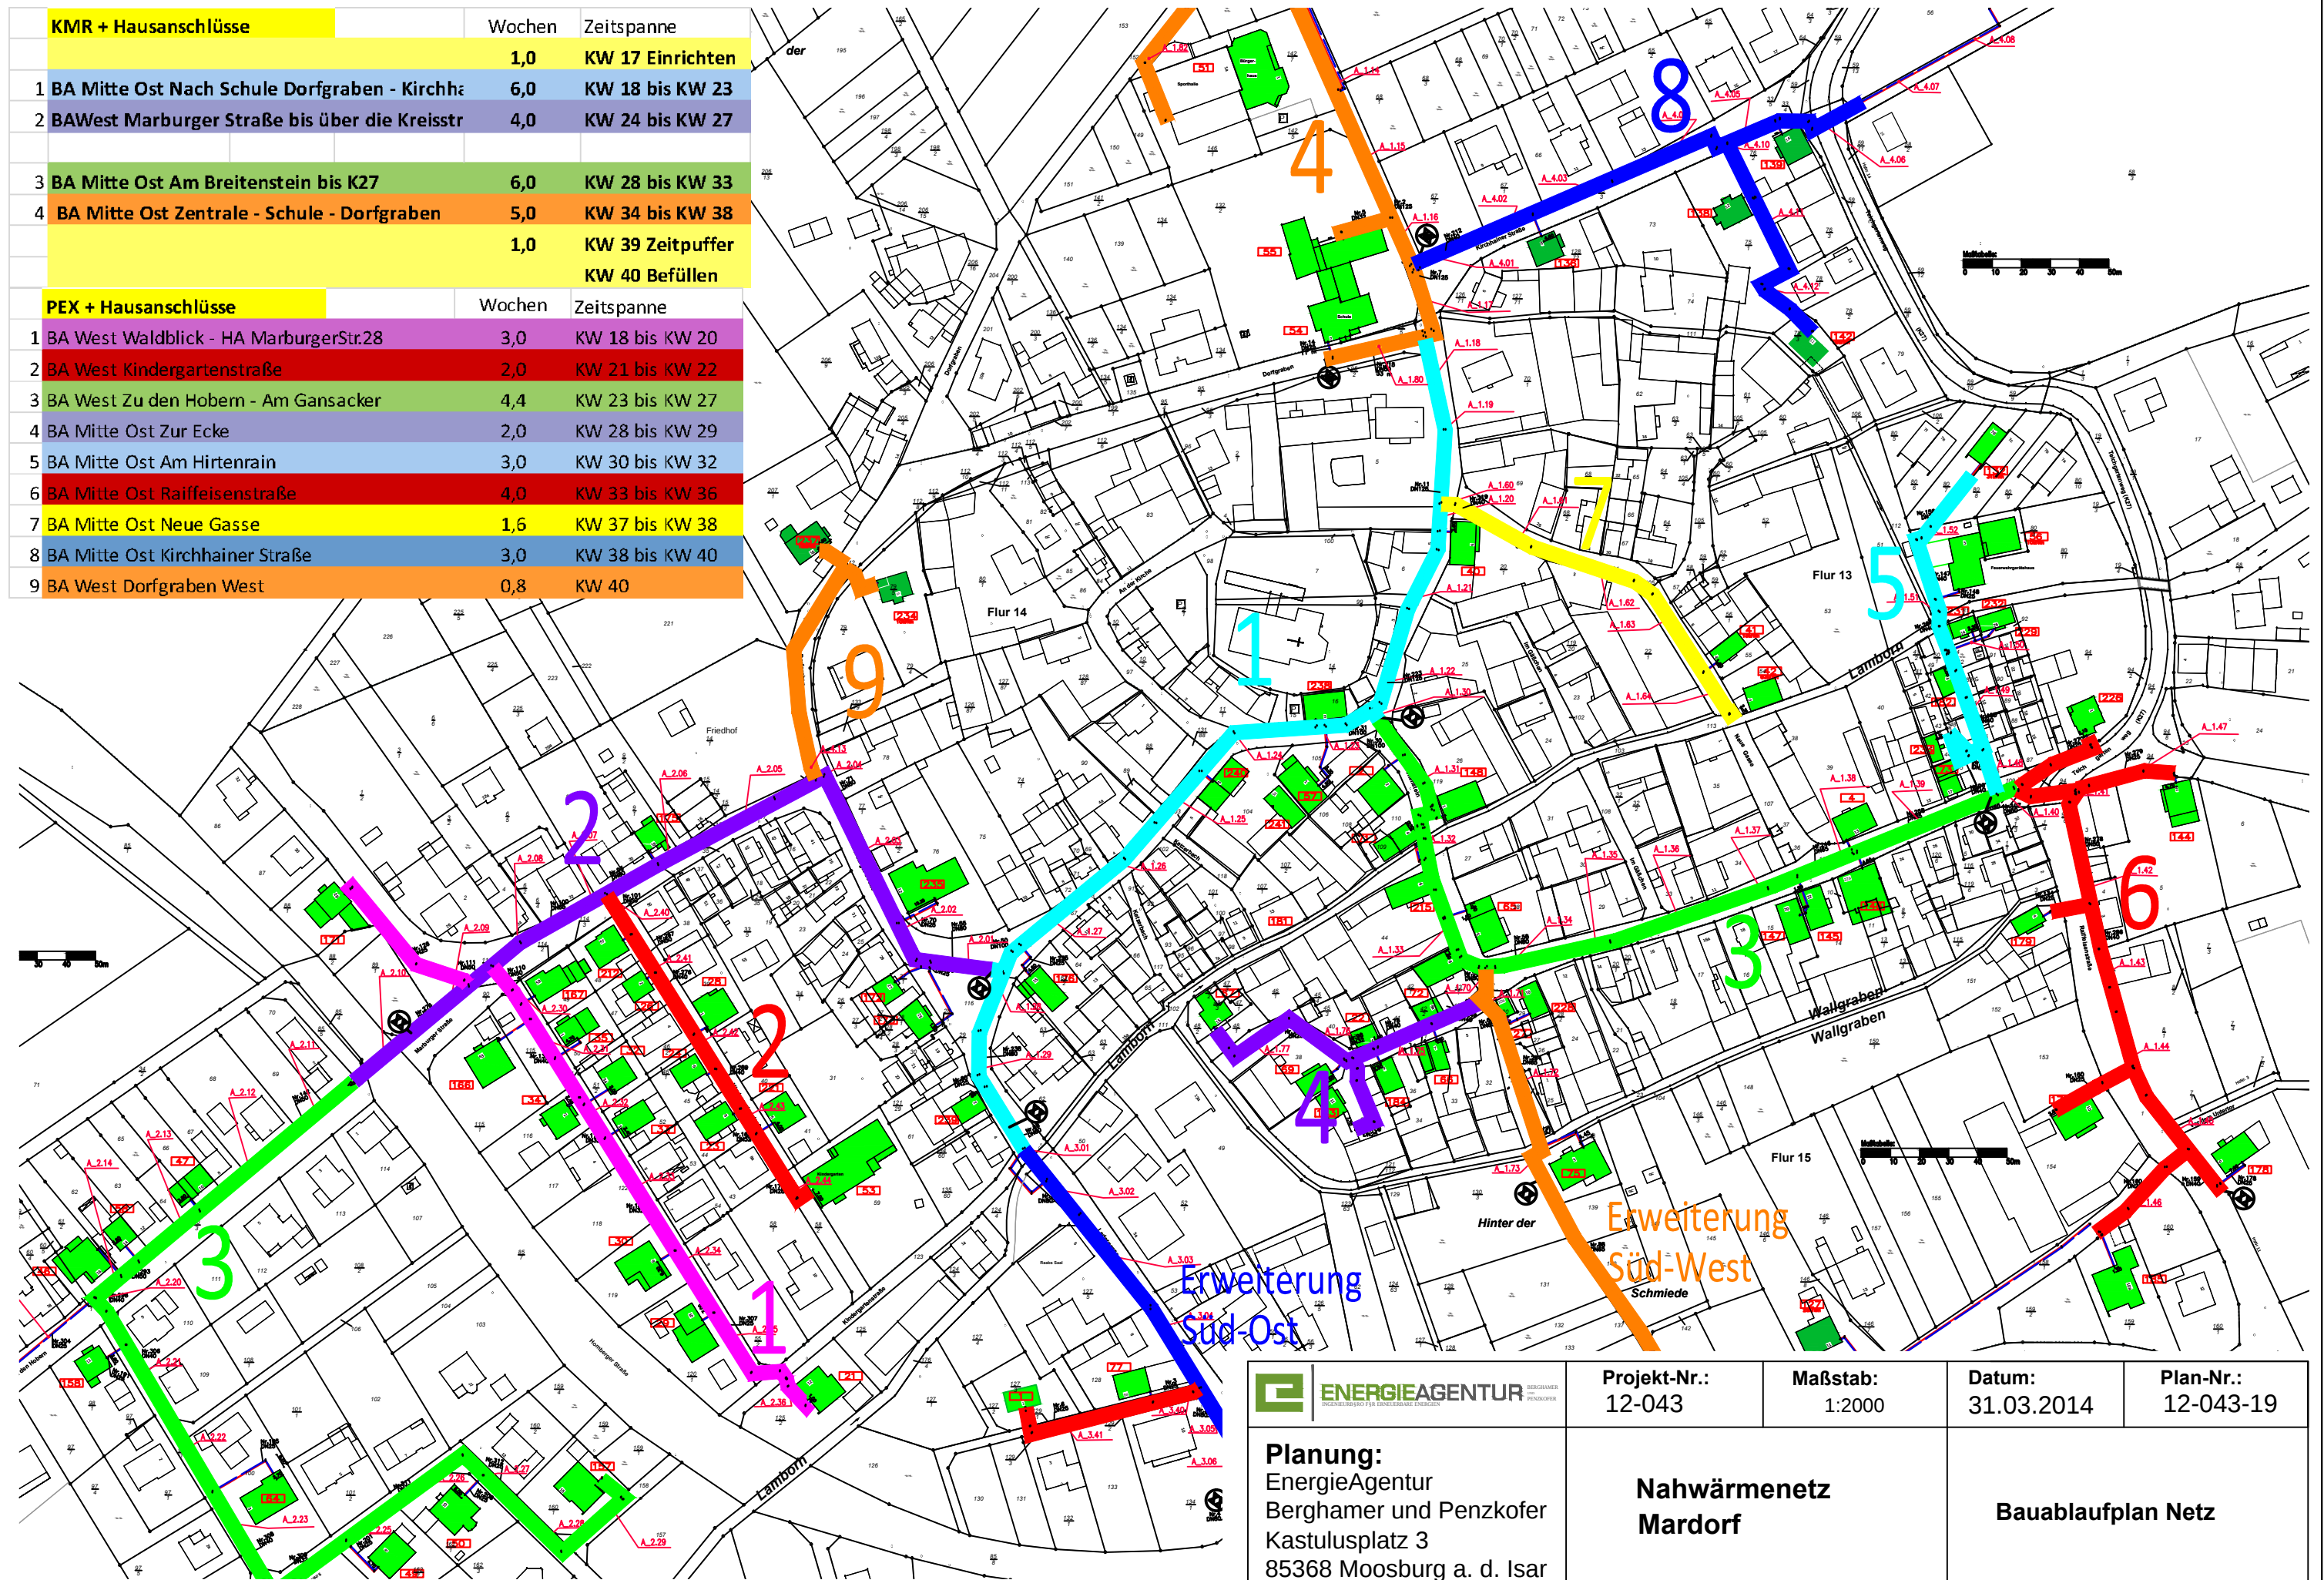

 ENERGIEAGENTUR INGENIEURBÜRO FÜR ENERGIEHAUSENERGIE	Projekt-Nr.: 12-043	Maßstab: 1:2000	Datum: 31.03.2014	Plan-Nr.: 12-043-19
	Planung: EnergieAgentur Berghamer und Penzkofer Kastulusplatz 3 85368 Moosburg a. d. Isar		Nahwärmenetz Mardorf	
Bauablaufplan Netz				
